


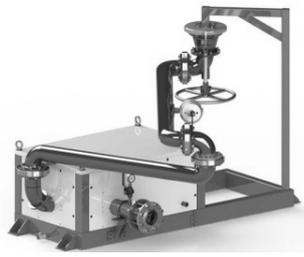
### ФОРМА ЗАКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ.

Подбор оптимального решения для **СЛИВА** нефтепродуктов из Ж/Д цистерн на Вашем объекте!

Контактные данные компании, заполнившей форму		Объект строительства или реконструкции		
Компания:		Строительство	...	Реконструкция
Ф.И.О., должность				
Телефон / Факс:		Климатические условия эксплуатации		
E-mail:		У (-45 + 40°C):	...	ХЛ (-60 + 40°C):

#### Характеристики сливаемых продуктов:

№ п/п	Продукт	Колебания температуры продукта, °С	Вязкость продукта при крайних температурах, сСт	Хим. состав нефтепродуктов	Наличие парафина, %	Плотность, кг/м <sup>3</sup>
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Наименование:	<b>Установка нижнего слива типа УСН</b>			Кол-во, шт.:	...
Вариант исполнения шарнирного трубопровода	Съемные шарниры		...	* - Доступна замена подшипника, уплотнений, полный срок службы 10 лет, неограниченное количество рабочих циклов.	
	Несъемные шарниры		...	* - Доступна замена уплотнений, полный срок службы 10 лет, ограниченное количество рабочих циклов, актуально для объектов с нечастым обслуживанием ЖД цистерн.	
Диаметр условного прохода, мм:	Ду100	Ду150	Ду175	Диапазон обслуживания вдоль оси цистерны, м.:	±2 (4)
	...	...	...		...
Кран шаровой	Да	Нет	Кол-во, шт.	Насосный блок для УСН Ду100	Да
	...	...	...		Нет
Стойка гаражного положения с датчиком ГП:	Устройство заземления:		Гидромонитор:	Электрообогрев:	Пароподогрев:
Дополнительные требования:					
	УСН с гидромонитором и обогревом		УСН с краном шаровым		УСН с насосным блоком
Для УСН Ду100 с насосным блоком необходимость учета:	Да	Нет	Кол-во продуктов	* - Используется для коммерческого учета нефтепродуктов при сливе. В комплект узла включены массовый расходомер и регулирующие отсечные клапаны. Точность измерения массы ± 0,25%; объема ± 0,25%; средней плотности ± 0,5кг/м <sup>3</sup> ; средней температуры ±0,5°С. Готовый узел является СИСТЕМОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АСН-15П и имеет соответствующий комплект разрешительной и сопроводительной документации.	
	...	...	...		

Проектирование	...	Шеф-монтаж	...	Пусконаладка	...	Доставка	...	Самовывоз	...
----------------	-----	------------	-----	--------------	-----	----------	-----	-----------	-----
